



Jakarta, 8 Januari 2021

Nomor: 002/BSSR-DIR/CS/I/2021

Kepada Yth.
Divisi Pencatatan Sektor Riil
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 1 Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Laporan Bulanan Kegiatan Eksplorasi PT Baramulti Suksessarana Tbk ("Perseroan") dan Anak Perusahaan Periode bulan Desember 2020

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan III.3.1 dan III.3.2 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Laporan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan Kegiatan Eksplorasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk bulan Desember 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Baramulti-Suksessarana Tbk

Yulius Leonardo
Sekretaris Perusahaan

LAPORAN BULANAN AKTIVITAS EKSPLORASI

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

DAN

PT ANTANG GUNUNG MERATUS (ANAK PERUSAHAAN)

PERIODE: DESEMBER 2020

PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (BSSR)

AKTIVITAS EKSPLORASI

Tidak ada kegiatan pemboran eksplorasi di bulan Desember 2020. Pemboran terakhir kali berakhir bulan Februari 2017 di Blok Bara 4 berupa *infill drilling*.

PT. ANTANG GUNUNG MERATUS

AKTIVITAS EKSPLORASI

I. WILAYAH

Kegiatan pemboran eksplorasi di bulan Desember 2020 berada Blok 2, Blok 3S Warutas, Blok 3N Ambutun, Blok 4 Waruba dan Blok 5, mencakup Desa Batulaki, Mallingin, Malutu, Mandala, dan Hamak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Desa Kembang Habang, Kabupaten Tapin.

II. METODE

- Teknik pemboran yang dilakukan adalah teknik pemboran miring untuk blok 4, blok 3S dan blok 3N dengan sudut penetrasi 30 derajat (diukur dari vertical) dengan arah 109-128 derajat dan vertical untuk Blok 2 dan Blok 5. Sistem pemboran adalah *touch coring*, dan setiap titik bor dilakukan pengukuran *geophysical logging*.
- Metoda atau pola pemboran yang diterapkan adalah *Stratigraphy drilling*, yaitu pemboran yang diatur sedemikian rupa secara semi detail dengan kerapatan antar line berkisar 500 hingga 1000 meter. Hal ini bertujuan untuk mengetahui urutan lapisan batuan secara menyeluruh.
- Kegiatan pemboran ini dilakukan dengan menggunakan total rig bor 13 unit, yaitu terdiri dari 3 unit Jackro 175, 3 unit Jackro 250, 2 Unit Jackro 275, 3 unit Jackro 300, dan 2 unit Jackro 400 yang semua unit menggunakan pipa HQ.

III. BIAYA

Biaya eksplorasi bulan Desember 2020

Biaya Eksplorasi	Dec-20	
	Anggaran (IDR)	Realisasi (IDR)
Total	1.206.974.000	1.405.235.000

IV. PENGAWASAN

Pemboran dilakukan oleh tiga kontraktor bor yaitu PT Karya Bumi Prima, PT Fajar Jaya, dan PT Noras. Kegiatan ini diawasi oleh 15 Orang Wellsite geologi PT Antang Gunung Meratus, 3 orang Geologist, dan 1 orang Senior Geologist, serta disupervisi langsung oleh PT Antang Gunung Meratus dibawah tanggung jawab Divisi Geologi.



VI. RENCANA SELANJUTNYA

Kegiatan pemboran selanjutnya di bulan Januari 2021 adalah sebagai berikut


No.	Block	Plan Januari 2021			
		Holes	Open (m)	Coring (m)	Total (m)
1	Blok 2	3	280,00	20,00	300,00
2	Blok 3S	6	540,00	60,00	600,00
3	Blok 3N	10	950,00	50,00	1000,00
4	Blok 4WB	6	560,00	40,00	600,00
5	Blok 5	6	560,00	40,00	600,00
Total		31	2890	210	3100

V. KEMAJUAN / HASIL PEMBORAN


Pemboran di bulan Desember 2020 menyelesaikan 43 titik bor dengan total kedalaman 3937.98 meter.

No.	Blok	Plan Desember 2020				Realisasi Desember 2020			
		Holes	Open (m)	Coring (m)	Total (m)	Holes	Open (m)	Coring (m)	Total (m)
1	Blok 2	15	750,00	50,00	800,00	7	499,80	23,70	523,50
2	Blok 3S	8	600,00	107,31	707,31	9	653,43	140,47	793,90
3	Blok 3N	15	700,00	90,41	790,41	19	1.710,18	50,35	1760,53
4	Blok 4WB	11	650,00	50,00	700,00	6	561,70	47,65	609,35
5	Blok 5	3	340,00	20,00	360,00	2	243,45	7,25	250,70
Total		52	3040	318	3358	43	3668,56	269,42	3937,98


Foto kegiatan pemboran:

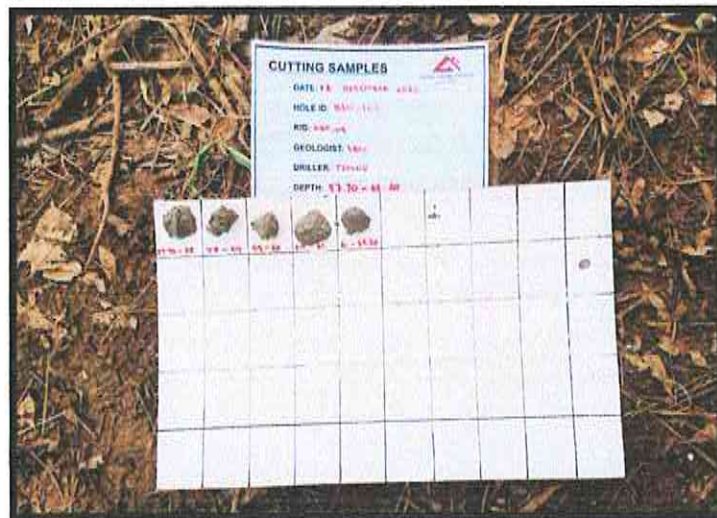


Biaya Eksplorasi	Anggaran Biaya Jan 2021
	Anggaran (IDR)
Total	1.106.000.000

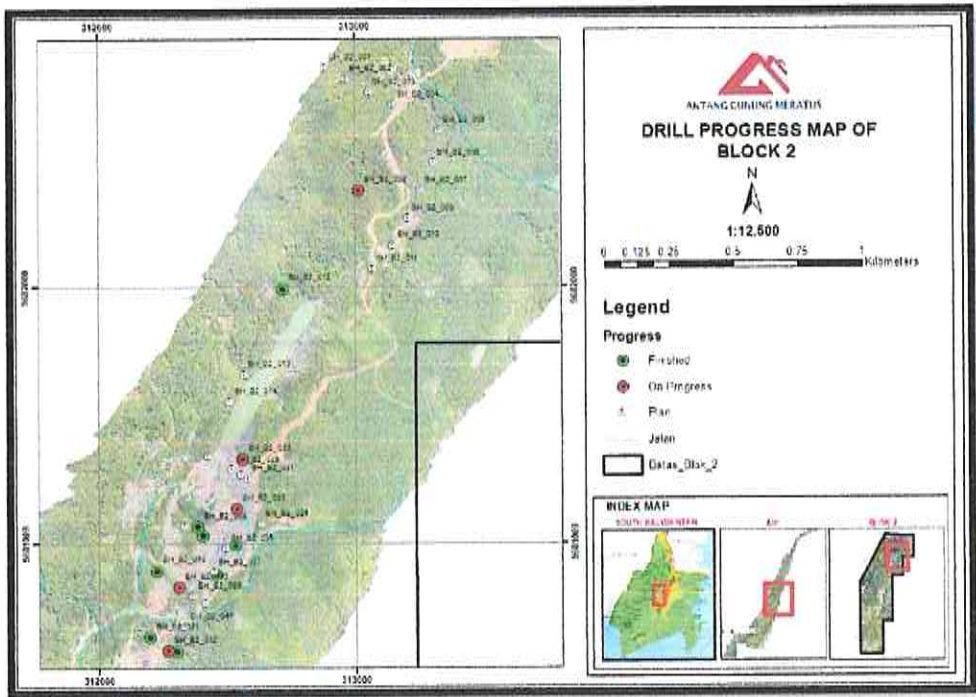


Peta Progress Pemboran Blok 2

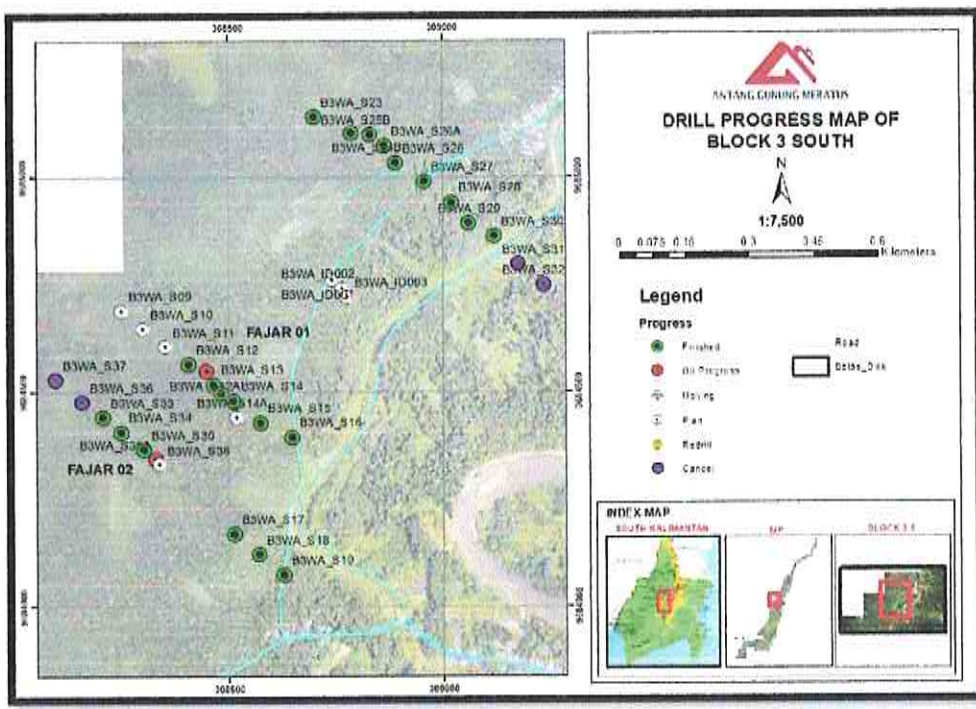

Peta Progress Pemboran Blok 3 South Warutas

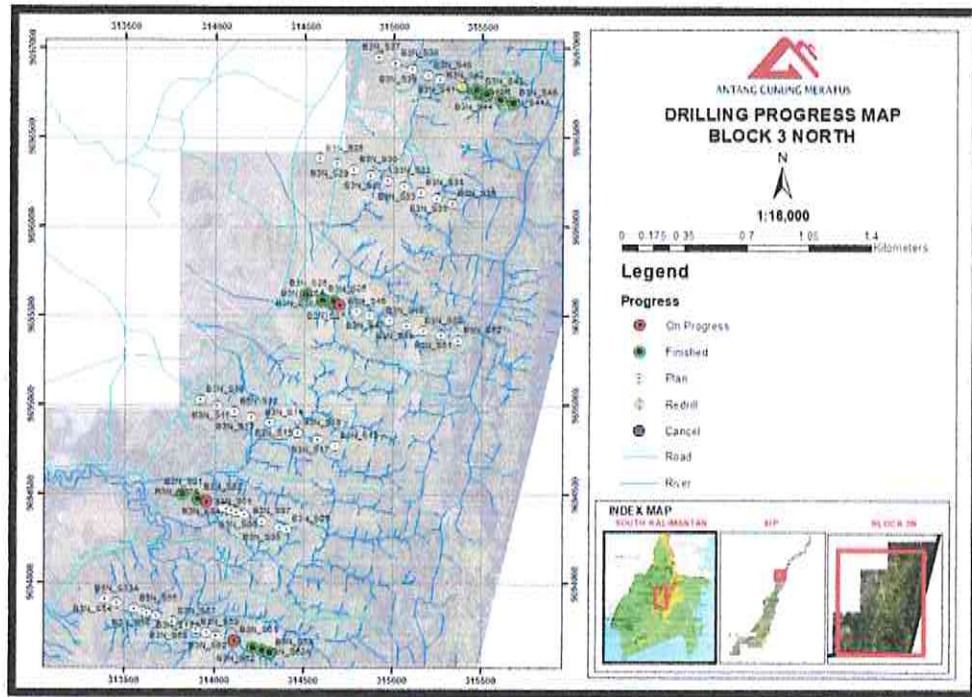

Peta Progress Pemboran Blok 3 North

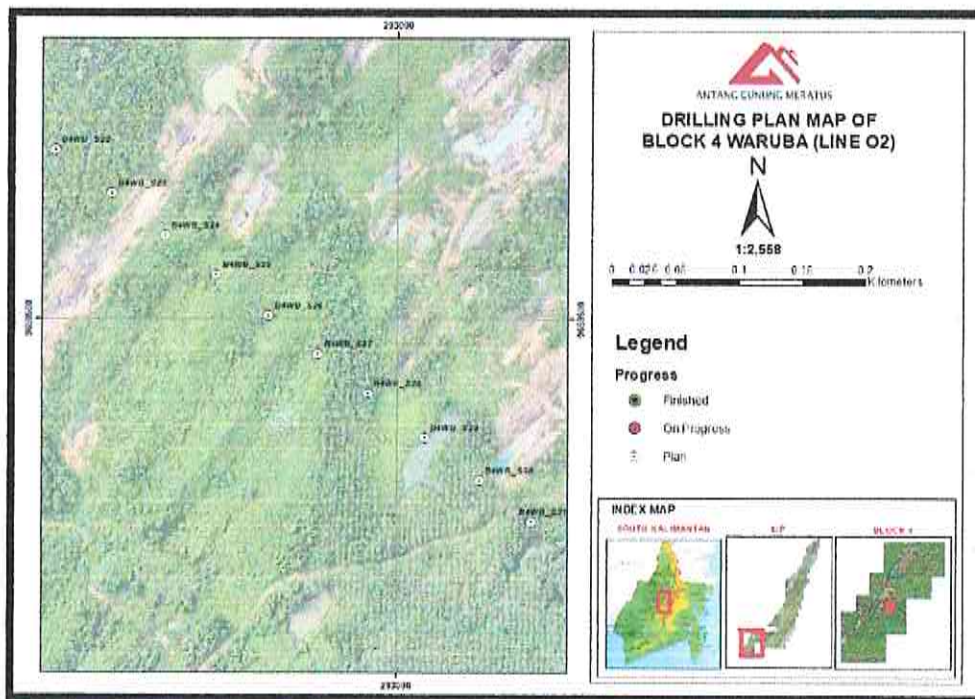

Peta Progress Pemboran Blok 4 Waruba
